



Ministerstvo životného prostredia SR

**Audítorské služby v oblasti systému finančného riadenia
verejnej správy a/alebo OP - Realizácia plánovaných
strategických hodnotení programov EÚ v zmysle platného
plánu hodnotení**

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Obsah

1	Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít jednotlivých prioritných osí	1
1.1	Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 1 (PO1)	2
1.1.1	Investičná priorita 1.1	2
1.1.2	Investičná priorita 1.2	9
1.1.3	Investičná priorita 1.3	15
1.1.4	Investičná priorita 1.4	18
1.2	Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 2 (PO2)	25
1.2.1	Investičná priorita 2.1	25
1.2.2	Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov	26
1.3	Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 3 (PO3)	27
1.3.1	Investičná priorita 3.1	27
1.4	Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 4 (PO4)	29
1.4.1	Investičná priorita 4.1	30
1.4.2	Investičná priorita 4.2	34
1.4.3	Investičná priorita 4.3	37
1.4.4	Investičná priorita 4.4	40
1.4.5	Investičná priorita 4.5	43

1 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít jednotlivých prioritných osí

Hodnotiaca otázka č. 1: „Aký je stav vyhlasovania výziev?“

Hodnotiaca otázka č. 2: „Aký je stav kontrahovania a čerpania alokácií na úrovni investičných priorít?“

Hodnotiaca otázka č. 3: „Aké je priebežné plnenie programových ukazovateľov OP?“

Príloha č. 1 správy je zameraná na zodpovedanie vyššie uvedených hodnotiacich otázok na úrovni všetkých investičných priorít OP KŽP.

V rámci zhodnotenia stavu vyhlasovania výziev (hodnotiaca otázka č. 1) sa hodnotiaca skupina zamerala na komparáciu pôvodného Indikatívneho harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016), resp. Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016), resp. aktuálnej verzie harmonogramu so skutočným stavom vyhlásenia výziev. Takisto bolo analyzované a porovnávané pokrytie jednotlivých aktivít a špecifických cieľov investičných priorít popísaných v OP KŽP s popisom oprávnených aktivít v rámci jednotlivých výziev tak, aby bolo možné identifikovať opatrenia, resp. aktivity, pre ktoré bude potrebné zabezpečiť vyhlásenie výzvy.

Odpoveďou na hodnotiacu otázku č. 2 je analýza absorpčnej kapacity jednotlivých výziev, teda zhodnotenie stavu schvaľovania žiadostí o NFP. Hodnotiaca skupina sa v tejto časti zamerala na vyhodnotenie miery kontrahovania/zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov pri výzvach s cieľom poukázať na oblasti s potenciálom na zlepšenie pre jednotlivé investičné priority.

Náplňou hodnotiacej otázky č. 3 bolo zhodnotenie vecného pokroku a napĺňanie ukazovateľov výstupu programu. Hodnotiaca skupina analyzovala mieru napĺňania výstupových ukazovateľov na úrovni programu.

1.1 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 1 (PO1)

1.1.1 Investičná priorita 1.1

Prioritná os	1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	1.1 – Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Investičná priorita 1.1 je zameraná na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, na zvyšovanie kapacít na triedenie komunálnych odpadov, prípravu pre opätovné použitie, recykláciu a iné zhodnotenie odpadov.

Pre investičnú prioritu 1.1 (IP 1.1. bol zadefinovaný 1 špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Výber špecifického cieľa v rámci investičnej priority (ďalej len „IP“) zameranej na odpady je orientovaný tak, aby sa jeho efekt prejavil najmä v znižovaní produkcie odpadov a v recyklovaní a využívaní odpadu ako potenciálneho a podmieneného zdroja druhotných surovín či zdroja na produkciu energie.

Očakávaný prínos opatrení by sa mal v konečnom dôsledku prejavovať ako zvýšená miera zhodnotených odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov.

01.01.2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom nového zákona o odpadoch je zníženie množstva odpadov zneškodňovaných skládkovaním, úprava a zameranie sa na predchádzanie vzniku odpadu, snaha minimalizovať negatívne vplyvy odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí ako aj zavedenie a uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov, ktorá by mala byť uplatňovaná aj na komunálnej úrovni.

Aj napriek faktu, že Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014, teda ešte pred prijatím nového zákona o odpadoch, opatrenia, ktoré sú súčasťou OP KŽP IP 1.1 priamo korelujú s novým legislatívnym rámcom. Priamy vzťah medzi opatreniami a cieľmi OP KŽP IP 1.1 a novou legislatívou môže mať dopad na sledovanie výstupových ukazovateľov. Úlohou RO bude zabezpečiť objektívne sledovanie prínosov OP KŽP očistených od prínosov nového legislatívneho rámca.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

1.1.1.1 Administrácia výziev

Z pôvodného harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014 vyplýva, že v období od roku 2015 až do marca 2016 sa plánovali vyhlásiť 4 výzvy v hodnote 399 159 362 EUR. V roku 2015 neboli reálne vyhlásené žiadne výzvy.

Harmonogram výziev pre rok 2016 (aktualizácia č. 5) predpokladal vyhlásenie 6 výziev, z ktorých reálne bola vyhlásená len 1 výzva na špecifický cieľ 1.1.1 aktivitu B – Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – časť Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v predpokladanej výške 20 000 000 EUR.

V rámci štyroch aktivít a troch oblastí intervencie (kód 17,18 a 19 oblasti intervencie – dimenzia 1) IP 1.1 bolo k referenčnému obdobiu 28.02.2017 vyhlásených 5 dopytovo orientovaných výziev v hodnote 251 000 000 EUR a jedno Vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP pre PO1 v hodnote 57 011 064 EUR. Celková suma alokácie doteraz vyhlásených výziev predstavuje 76 % z celkovej alokácie pre IP 1.1. Ďalších šesť výziev plánovaných v roku 2017 by malo pokryť cca 19 % z celkovej alokácie pre IP 1.1. Najväčšie percento alokácie vyhlásených výziev pokrýva alokácia pre výzvu č. 16 zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

1.1.1.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Graf 1 znázorňuje tendenciu v schvaľovacom procese a v zazmluvnení pre doteraz vyhlásené výzvy. Najvyššiu mieru schválených a zazmluvnených žiadostí o NFP má uzavretá výzva č. 10 zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a to 88%. **Miera schválených a zazmluvnených žiadostí o NFP na celkovej alokácii pri ďalšej uzavretej výzve č. 11 dosiahla 79 %. V rámci výziev č. 12, 15 a 16 prebieha administratívne overenie žiadostí a je možné ich hodnotiť a porovnávať s uzavretými výzvami len z hľadiska budúcich prognóz podľa počtu doteraz prijatých žiadostí o NFP.**


Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 1

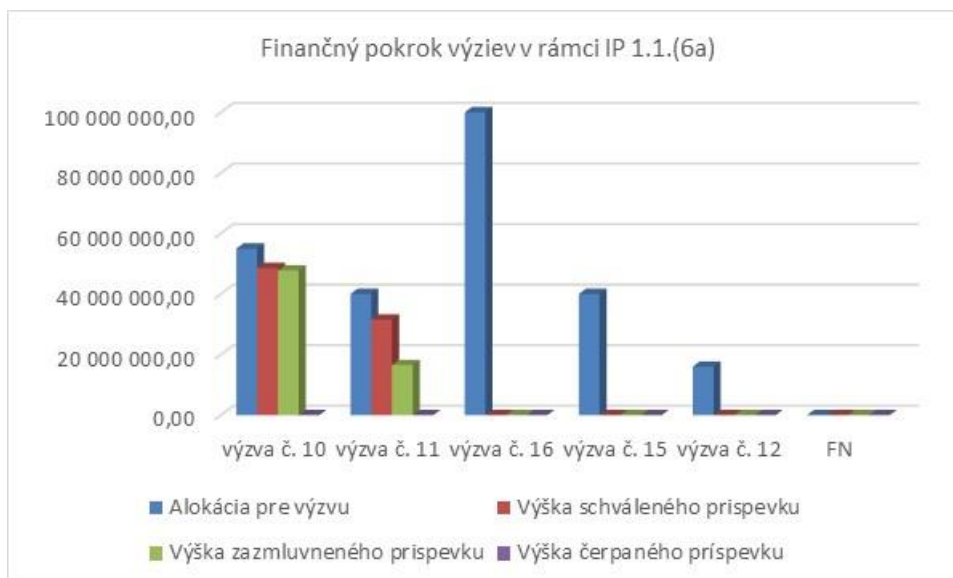

Na základe skúseností z doteraz realizovaných a hodnotených uzavretých výziev (výzva č. 10 a 11) **bola vypočítaná prognóza pomeru výšky schváleného nenávratného finančného príspevku z celkovej výšky žiadaných príspevkov doručených v ŽoNFP. Tento pomer predstavuje necelých 48 %**. Nízkou predpokladanú mieru schválenia žiadostí o NFP na celkovej alokácii pri výzvach č. 16 pre aktivitu B (oblasť intervencie 017 a 019) a výzvu č. 15 pre aktivitu C (oblasť intervencie 019) znázorňuje podrobnejšie aj Graf 2. Z Graf 2 vyplýva, že za obdobie približne štyroch mesiacov trvania výzvy bolo v rámci výzvy č. 10 schválených až 88 % alokovaných prostriedkov a v rámci výzvy č. 11 to bolo viac ako 41 %. Naopak, pri výzve č. 16 by to bolo len 22 % a pri výzve č. 15 by pomer schválených prostriedkov z celkovej alokácie výzvy nedosahoval ani 6 %.

Graf 2



Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1


Máj 2017

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné v rámci finančného pokroku sledovať, sú oblasti intervencií danej prioritnej osi, ktorých alokácie sú uvedené v OP KŽP. Graf 3 znázorňuje distribúciu celkových alokácií (podľa OP KŽP) a alokácií pre realizované a plánované výzvy medzi jednotlivé oblasti intervencie. **Z analýzy distribúcie alokácií medzi oblasti intervencie vyplýva, že v rámci oblasti intervencie 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) súhrn alokácií realizovaných a plánovaných výziev prevyšuje celkovú alokáciu pre danú oblasť intervencie o 48 112 600 EUR (výpočet uvedený v tab. 2 prílohy č. 2 Správy z Hodnotenia OP KŽP).** . Alokácie pre realizované a plánované výzvy pre oblasť intervencie 018 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a skládkovanie) presahujú hodnotu celkovej alokácie pre danú oblasť intervencie o 10 926 373 EUR.

Najnižšia (iba 69 %) miera alokácie pre realizované a plánované výzvy bola zaznamenaná pri oblasti intervencie 019 - Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom.

Popísaná distribúcia alokácií medzi oblasti intervencie sa odráža aj na finančnom pokroku. Finančný pokrok je znázornený v Graf 4.

Graf 3

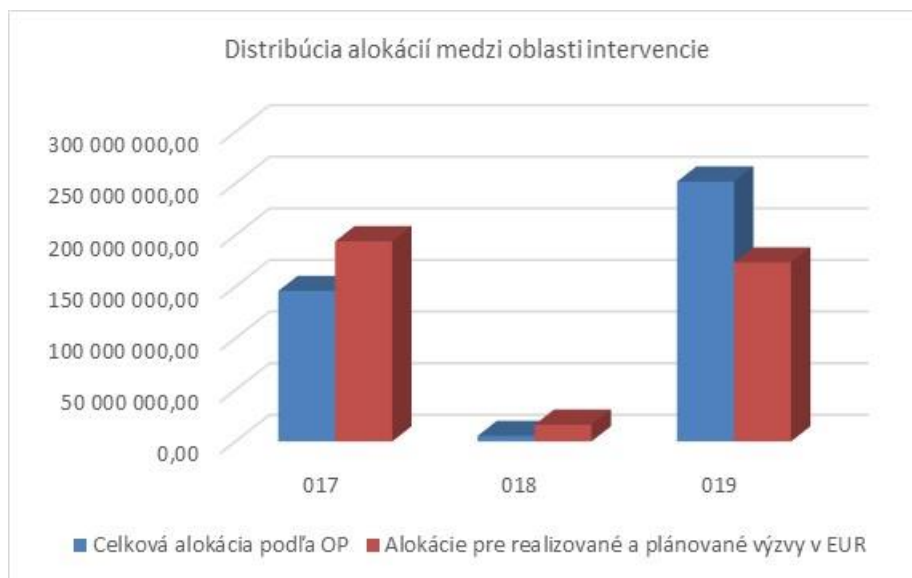


Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 4

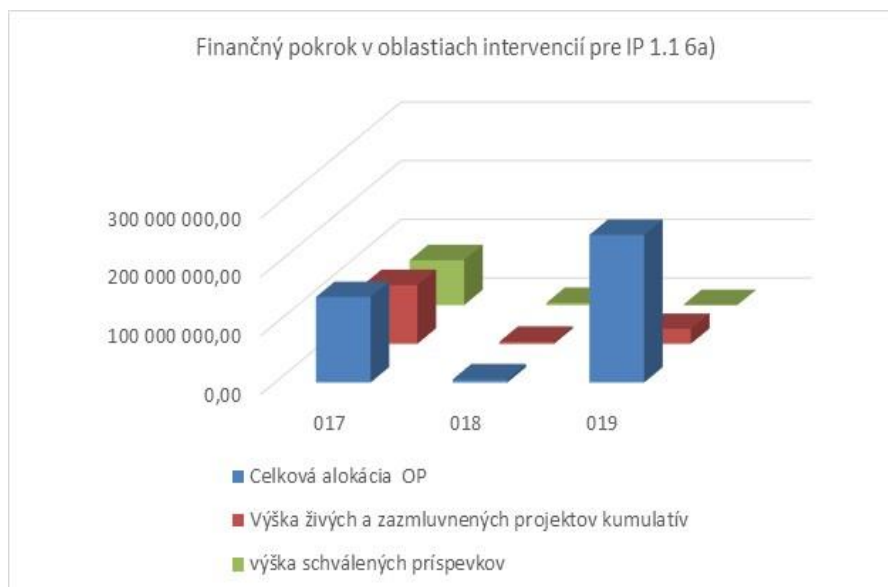

Miera čerpania finančných prostriedkov dosahuje 0% (okrem tranže poskytnutej SZRB Asset Management, a.s. v rámci využitia finančných nástrojov). Tento stav je spôsobený omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní výziev, čím došlo k neskoršiemu schvaľovaniu a zazmluvňovaniu projektov.

1.1.1.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre IP 1.1. vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – ante hodnotenia zo skúseností v predošlom programovacom období a rešpektovalo všetky relevantné usmernenia. Ukazovatele na úrovni výstupov boli nastavené tak, aby zodpovedali jednotlivým typom aktivít.

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov zrealizovaných v programovom období 2007 - 2013.

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 – 2013 a k nim bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú podložené expertným odhadom.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.1:

Ukazovateľ výstupu programu	Kód ukazovateľa	Cieľová hodnota 2023	Zazmluvnená hodnota	Hodnota schválených ŽoNFP	Hodnota všetkých prijatých ŽoNFP	Naplnenie cieľovej hodnoty pri všetkých prijatých žiadostiach o NFP	Napĺňanie cieľovej hodnoty pri zazmluvnených žiadostiach o NFP v %	Čiastková hodnota ukazovateľa (míľníka) v roku 2018 (sledované pri ukazovateľoch výkonnostného rámca)
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu	CO17 v t/rok	197 466	32 170	0	169 395	86%	16,29%	x
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov	O0002 v t/rok	21 579	49 076	9 548	58 624	271,67%	227,42%	8 632
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov	O0003 v t/rok	329 676	81 236	16 111	616 881	187,12%	24,64%	34 579
Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve	O0004 počet	1	0	0	1	100%	0,00%	x
Počet zrealizovaných informačných aktivít / Počet hlavných podujatí v rámci publicity (P)	O0178 počet	322	220	4	0	0%	69,56%	x

V rámci sledovaných piatich ukazovateľov výstupu programu pre IP 1.1 uvedených v OP KŽP je predpoklad naplnenia cieľových hodnôt v roku 2023 pri ukazovateli O0002 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov až **227,42%**, O0003 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov **24,64%**, CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu **13,37%** (vychádzajúc z predpokladanej realizácie dosiaľ zazmluvnených projektov). Pre ďalšie dva ukazovatele výstupu programu O0004 Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve a O0178 Počet zrealizovaných informačných aktivít neboli doposiaľ zazmluvnené žiadne projekty. (znázornené v grafe č. 5) Pre posúdenie možností finančných realokácií je dôležitá prognóza vo vývoji budúceho napĺňania ukazovateľov výstupov, preto hodnotiaca skupina posúdila plánované hodnoty ukazovateľov vo všetkých prijatých

Ministerstvo životného prostredia SR


Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

žiadostiach o NFP, aj pre žiadosti, ktoré neboli doposiaľ vyhodnotené. Pri ukazovateľoch výstupu O0002 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov, O0003 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov, CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu a O0004 Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný systém v odpadovom hospodárstve je predpoklad naplnenia cieľovej hodnoty 100 až 272%. Ukazovateľ výstupu CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu by pri realizácii všetkých prijatých žiadostiach o NFP dosiahol hodnotu 86 %, hoci ešte neboli realizované ďalšie výzvy plánované na rok 2017 so zameraním na triedenie, zhodnocovanie a recykláciu odpadov. Pre informačné aktivity bude v roku 2017 realizovaný národný projekt, ktorého výstupy naplnia programový ukazovateľ O0178 Počet zrealizovaných informačných aktivít.

Graf 5

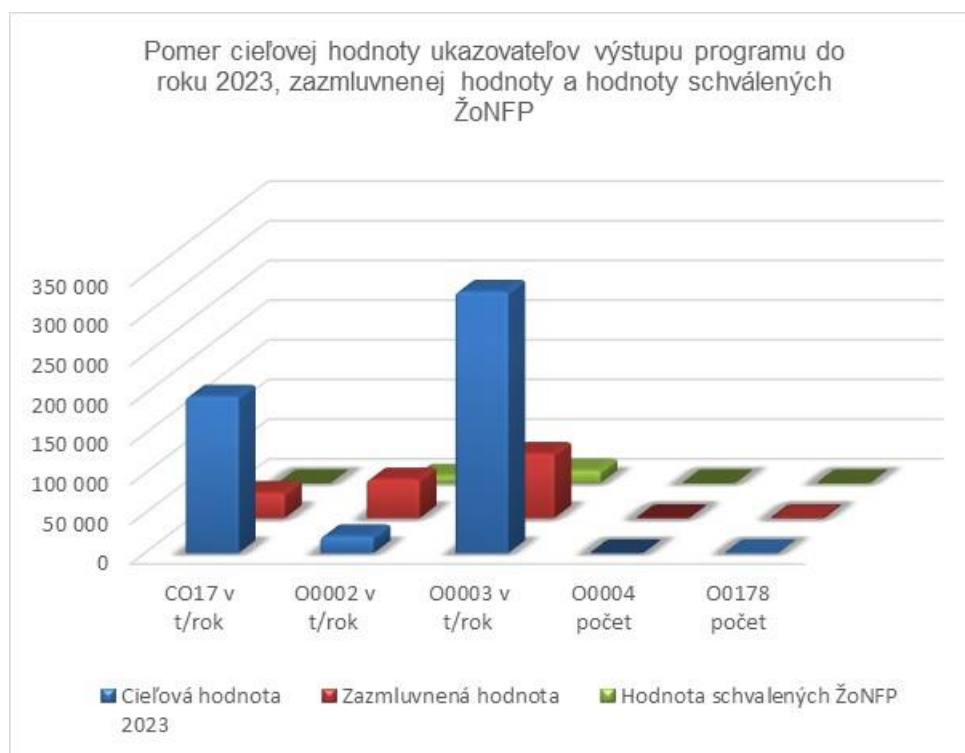

Napĺňanie ukazovateľov výstupov programu pre IP 1.1 neindikuje vzhľadom na predpokladaný pokrok vo vyhlasovaní výziev a tiež pokrok v zazmluvnení schválených projektov riziko nesplnenia cieľových hodnôt. Riziko nesplnenia cieľových hodnôt by mohlo nastať pri nedodržaní zmluvného harmonogramu realizácie aktivít projektov, predlžovaní realizácie projektov vzhľadom na problémy s vyhláseným VO, nedostatočnej pripravenosti projektového tímu atď.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

1.1.2 Investičná priorita 1.2

Prioritná os	1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	1.2 – Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Investičná priorita Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie je v súlade so strategickými materiálmi, ktorých zámerom je splniť predovšetkým požiadavky Rámcovej smernice o vode (ďalej len „RSV“).

V súlade s RSV je cieľom zrealizovať opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd do r. 2015, resp. 2021, najneskôr však do r. 2027. Nástromom na plnenie cieľov RSV je Vodný plán SR, ktorý zahŕňa plány manažmentu povodí Dunaja a Visly a tiež prijatá Stratégia vodného hospodárstva.

Pre investičnú prioritu IP 1.2. boli zadané 3 špecifické ciele: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ; Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi a Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd.

1.1.2.1 Administrácia výziev

Z pôvodného Indikatívneho harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014 vyplýva, že v priebehu roku 2015, resp. do marca 2016 sa plánovalo vyhlásiť 6 výziev v hodnote 483 437 757 EUR. V roku 2015 boli reálne vyhlásené 3 výzvy v hodnote 460 000 000 EUR. Z pôvodne plánovaných výziev neboli vyhlásené výzvy pre aktivitu B Špecifického cieľa 1.2.1. a aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravni povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou a aktivita C Špecifického cieľa 1.2.3. Naopak, výzva č. 1 pre aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.1 a 1.2.2. (časť – výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov v jednej ryhe s kanalizáciou) bola navýšená na 400 000 000 EUR.

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2016 verzia 1 predpokladal vyhlásenie 3 výziev pre nerealizované výzvy z harmonogramu výziev pre roky 2015 – 2016 pre aktivitu B Špecifického cieľa 1.2.1. a aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.2. (časť Intenzifikácia) v hodnote 48 000 000 EUR. Navyše sa predpokladalo vyhlásenie výzvy pre aktivitu B Špecifického cieľa 1.2.3., ktorá bola realizovaná až začiatkom roka 2017.

V rámci šiestich aktivít a štyroch oblastí intervencie (kód 020, 021, 022 a 085 oblasti intervencie - dimenzia 1) investičnej priority 1.2. boli k referenčnému obdobiu 28.02.2017

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

reálne vyhlásené 4 dopytovo orientované výzvy v hodnote 481 000 000 EUR a jedno Vyzvanie pre II. fázu veľkého projektu – ČOV Sever v hodnote 50 000 000 EUR.

Vyhlásené výzvy boli zamerané na kanalizácie, ČOV a vodovody (výzva č. 1 – oblasť intervencie 022 a 020), na monitorovanie a hodnotenie vôd (výzva č. 8, oblasť intervencie 021), na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (výzva č. 9, oblasť intervencie 021) a zabezpečenie spojitosti vodných tokov (výzva č. 17, oblasť intervencie 085).


Alokácia pre výzvu č. 1 zahŕňa aktivitu A1 Špecifického cieľa 1.2.1. – Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ a aktivitu A2 Špecifického cieľa 1.2.2. časť – výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov.

Vyhlásené výzvy pokrývajú aj aktivity A Špecifického cieľa 1.2.3. a B Špecifického cieľa 1.2.3. Naopak, žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivitu B1 špecifického cieľa 1.2.1. – Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktorá prispeje k výraznému zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový, aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou a aktivitu C Špecifického cieľa 1.2.3. – Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva.

1.1.2.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Graf 6 znázorňuje mieru schválených žiadostí o NFP, ktorá je najvyššia pri uzavretej výzve č.1 pre oblasť intervencie 022 a 020 a dosahuje až 99 % a 94 % pri písomnom vyzvaní pre oblasť intervencie 022. Takisto sa pri výzve č. 1 vytvoril, vzhľadom na veľký dopyt, zásobník projektov v hodnote 134 281 703 EUR. **Napriek faktu, že výzvy č. 8 a č. 9 boli vyhlásené ešte v roku 2015, možno konštatovať, že výška schváleného príspevku pre výzvu č. 8 dosahuje necelých 50 % z celkovej alokácie pre výzvu. Pri výzve č. 9 v rámci 6. hodnotiacich kôl nebola prijatá žiadna žiadosť o NFP (v oboch prípadoch je oprávneným prijímateľom právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie výskytu, množstva, režimu a kvality podzemných vôd podľa vodného zákona; právnická osoba poverená MŽP SR na zisťovanie množstva, režimu, kvality povrchových vôd a vplyvov pôsobiacich na kvalitu povrchových vôd, správca vodohospodársky významných vodných tokov).** Podobná situácia, keď nebola predložená žiadna žiadosť o NFP je zatiaľ aj pri výzve č.17, ktorá však bola vyhlásená len vo februári 2017.

Graf 6

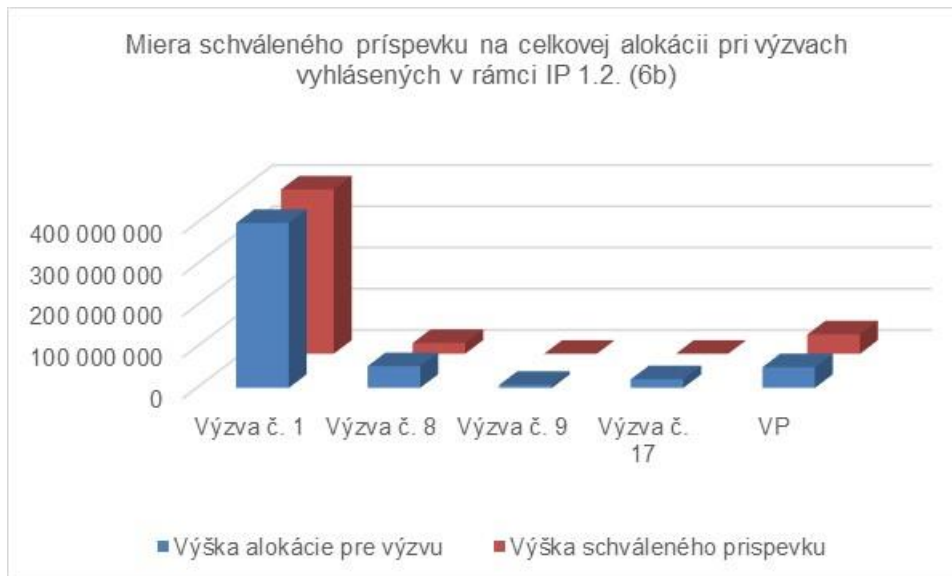

Graf 7



Miera zazmluvnenia schválených žiadostí o NFP dosiahla najvyššiu hranicu pri veľkom projekte schválenom na základe vyzvania. Výzva č. 1 a Výzva č. 8 dosiahli mieru zazmluvnenia 98 – 99 % (Graf 7). **Rizikovou oblasťou zostáva čerpanie finančných prostriedkov, nakoľko miera čerpania prostriedkov je 3,7 % aj napriek faktu, že napr. výzva č. 1 bola uzavretá už pred viac ako 12 mesiacmi.**

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné v rámci finančného pokroku sledovať, sú oblasti intervencií danej prioritnej osi, ktorých alokácie sú uvedené v OP KŽP.

Graf 8 zobrazuje pomer výšky celkovej alokácie a výšky schváleného príspevku pre jednotlivé oblasti intervencií IP 1.2. Výška schválených žiadostí o NFP pre oblasť

Ministerstvo životného prostredia SR


Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

intervencie s kódom 022 – Čistenie odpadových vôd indikuje presiahnutie alokácie o 42 797 418 EUR a 020 – Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie a distribúciu) dosiahla 28 % z alokácie podľa OP KŽP. Oblasť intervencie s kódom 021 – Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody (vrátane manažmentu povodia, dodávok vody, osobitných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, diaľkových a spotrebiteľských meracích zariadení, systémov spoplatňovania a znižovania únikov) nedosiahla ani 33 % z alokácie, napriek tomu, že ešte koncom roka 2015 boli vyhlásené pre túto oblasť dve výzvy. Pre oblasť intervencie s kódom 085 – Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra nebola k referenčnému dátumu podaná žiadna žiadosť o NFP. Nakoľko však bola výzva č. 17 vyhlásená len vo februári 2017, zhodnotenie pokroku v rámci oblasti intervencie 085 bude možné až po uzatvorení výzvy.

Graf 8

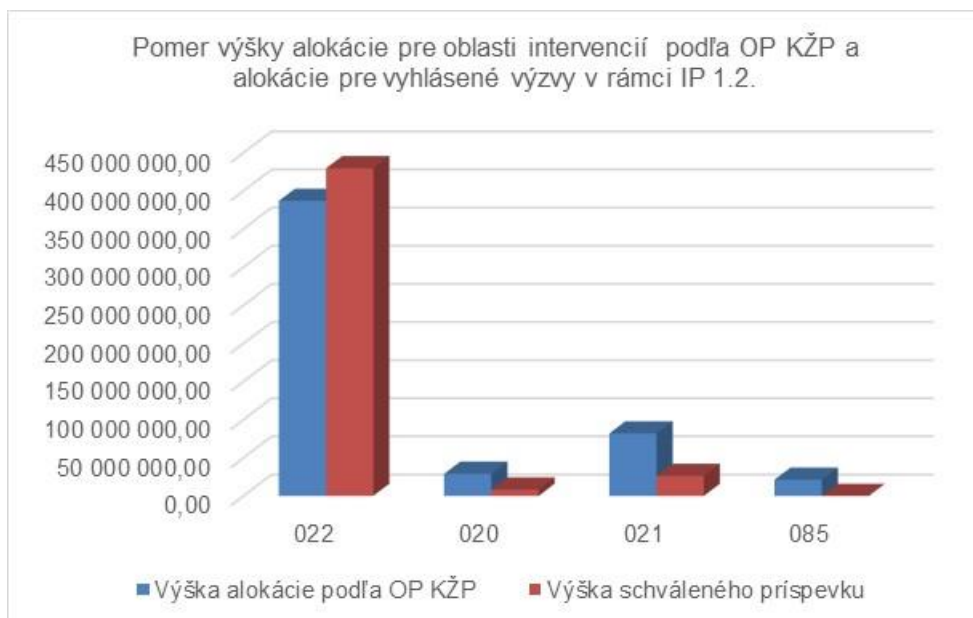

1.1.2.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre investičnú prioritu 1.2, podobne ako pri investičnej prioritě 1.1, vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – ante hodnotenia zo skúseností v predošlom období a rešpektovalo všetky relevantné usmernenia. Ukazovatele na úrovni výstupov boli nastavené tak, aby zodpovedali jednotlivým typom aktivít.

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov zrealizovaných v programovom období 2007 -2013.

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 –

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

2013 a k nim bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú podložené expertným odhadom.

Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.2:

Ukazovateľ výstupu programu	Kód ukazovateľa výstupu programu s mernou jednotkou	Cieľová hodnota 2023	Zazmluvnená hodnota ukazovateľov	Skutočný stav dosahovania ukazovateľov	Naplnenie cieľovej hodnoty pri všetkých prijatých žiadostiach o NFP	Cieľová hodnota ukazovateľa v roku 2018(sledované pri ukazovateľoch výkonnostného rámca) spolu za všetky aktivity
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd	C019 EO	205 046	273 863	3 500	134%	20 505
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody	CO18 osoby	86 079	3 129	0	4%	x
Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd	O0176 počet	786 929	887 546	74 094	113%	x
Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd	O0006 počet	2 295	0	0	0%	x
Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd	O0007 počet	1 835	1 632	49	89%	x
Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch	O0008 počet	345	0	0	0%	x
Počet zrealizovaných informačných aktivít	O0178 počet	116	0	0	0%	x
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	O0009 počet	34	0	0	0%	x

Na základe analýzy ukazovateľov výstupu programu, ktoré vychádzajú z ukazovateľov projektu, je zrejmé, že prognóza dosiahnutia najvyššej miery ukazovateľov výstupu z celkovej hodnoty v doteraz zazmluvnených projektoch je **sledovanom ukazovateľovi výstupu CO19 je predpoklad naplnenia cieľovej hodnoty až 134 % (viď Graf 9).**

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Ukazovateľ CO19 – Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd bol zaradený do sledovaných ukazovateľov výkonnostného rámca pre IP 1.2. **Skutočný stav dosiahnutia hodnôt pri všetkých ukazovateľoch je nízky vzhľadom na neskorší začiatok realizácie projektov spôsobený predĺžením kontraktnej fázy a tiež problémami resp. prolongáciami, ktoré vznikli pri procese verejného obstarávania vykonávaného prijímateľmi.**

Graf 9



Napĺňanie špecifického cieľa 1.2.1. je dosiahnuté prostredníctvom oprávnených aktivít A1 – Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ a B1 – Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový. Výzva č. 1 pokrýva aktivitu A Špecifického cieľa 1.2.1. a A Špecifického cieľa 1.2.2.(časť – výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov v jednej ryhe s kanalizáciou), ale vzhľadom na veľmi dobrú absorpčnú kapacitu a dopyt zo strany žiadateľov bola navýšená na 400 000 000 EUR. **Výzva na aktivitu B špecifického cieľa 1.2.1. nebola k referenčnému dátumu vyhlásená. Napriek tomu, je na základe hodnôt zazmluvnených projektov predpoklad, že všetky ukazovatele výstupu projektov aj programu za špecifický cieľ 1.2.1. budú dosiahnuté za predpokladu dodržania zazmluvnených harmonogramov aktivít projektov.**

Výrazne nižší progres bol dosiahnutý pri ukazovateľoch výstupu CO18 – Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody (predpoklad naplnenia cieľovej hodnoty na základe zazmluvnených projektov dosiahne v roku 2023 len necelé 4 %).

Výsledky predpokladaného napĺňania ukazovateľov pre špecifický cieľ 1.2.2. priamo korelujú s finančným pokrokom pre tento špecifický cieľ. Alokácia pre výzvu č. 1

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

pokrývala aj aktivitu A2 Špecifického cieľa 1.2.2. časť – výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov, čo sa odrazilo v naplnení ukazovateľa výstupu s kódom P0042 a čiastočne aj ukazovateľa s kódom CO18. **Naopak, žiadna vyhlásená výzva pre aktivitu A1 Špecifického cieľa 1.2.2. časť Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravni povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou sa odrazila na hrozbe nenaplnenia ukazovateľa CO18.**

Napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu v rámci špecifického cieľa 1.2.3. dosahuje nadpriemerné hodnoty iba pri ukazovateli O0176 – Počet analyzovaných vzoriek povrchových a podzemných vôd, kde zazmluvnené hodnoty dosahujú 113 % cieľovej hodnoty v roku 2023. Ukazovateľ výstupu O0007 – Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných vôd pri zrealizovaní zazmluvnených projektov dosiahne hodnotu 89% cieľovej hodnoty. **Ďalšie štyri sledované ukazovatele sú napĺňané na 0 % a v rámci realizovaných výziev nebol predložený žiadny projekt, ktorý by prispieval k naplneniu uvedených ukazovateľov.**

Uvedený stav ukazovateľov výstupu programu súvisí s vyhlásenými výzvami v rámci špecifického cieľa 1.2.3. **Nepriaznivý stav napĺňania ukazovateľa O008 – Počet opatrení na zabezpečenie spojitosti vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch je ovplyvnený krátkym trvaním výzvy pre aktivitu A, ktorá priamo súvisí s nenaplnením uvedeného ukazovateľa. Nevyhlásenie žiadnej výzvy pre aktivitu C sa negatívne odrazilo na stave napĺňania ukazovateľa O0178 – Počet zrealizovaných informačných aktivít a O0009 – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov.**

1.1.3 Investičná priorita 1.3

Prioritná os	1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	1.3 – Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Súčasťou IP 1.3. sú opatrenia zamerané na biologickú diverzitu. IP je plne v súlade s cieľmi EÚ Stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020, ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020. Súčasne je v súlade s celosvetovým kontextom vyjadreným v implementácii OSN Dohovoru o biologickej diverzite. Opatrenia zamerané na biodiverzitu sú tiež v súlade s Národnou stratégiou ochrany biodiverzity v SR.

Pre investičnú prioritu IP 1.3 bol zadefinovaný jeden špecifický cieľ: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä rámci sústavy Natura 2000.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

1.1.3.1 Administrácia výziev

Z pôvodného indikatívneho harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014, verzia 1, vyplýva, že v roku 2015 sa plánovalo vyhlásenie 4 výziev v hodnote 112 519 565 EUR. V roku 2015 neboli reálne vyhlásené žiadne výzvy.

Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2016, verzia 1, predpokladal vyhlásenie 4 výziev, najmä pre nerealizované výzvy z harmonogramu výziev pre roky 2015 – 2016. V roku 2016 bola vyhlásená jediná výzva v hodnote 15 800 000 EUR (výzva č. 13), ktorá je zameraná na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu. V roku 2017 sa predpokladá vyhlásenie výziev pre aktivitu A – Dobudovanie sústavy NATURA 2000 vo výške 38 000 000 EUR a výzvu na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov vo výške 13 000 000 EUR. Zároveň by mal byť v roku 2017 realizovaný Národný projekt na informačné aktivity a tiež by mala byť vyhlásená výzva zameraná na informačné aktivity.

1.1.3.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Jediná výzva v rámci IP 1.3 bola vyhlásená v apríli 2016. **Napriek ročnému trvaniu výzvy, nebola v rámci 6. hodnotiacich kôl predložená žiadna žiadosť o NFP**, čo bolo spôsobené problémami nie len na strane Štátnej ochrany prírody SR, ako jediného oprávneného prijímateľa, ale aj zo strany MŽP SR.

Vyhlásenie jedinej výzvy z nízkou absorpčnou kapacitou sa odrazilo na nulovom finančnom pokroku celej IP 1.3 .

1.1.3.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre IP 1.3 , podobne ako pri všetkých IP PO 1, vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – ante hodnotenia zo skúseností v predošlom období a rešpektovalo všetky relevantné usmernenia. Ukazovatele na úrovni výstupov boli nastavené tak, aby zodpovedali jednotlivým typom aktivít.

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov zrealizovaných v programovom období 2007 – 2013.

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 – 2013 a ním bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú podložené expertným odhadom.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.3:

Ukazovateľ výstupu programu	Kód ukazovateľa projektu	Cieľová hodnota 2023	Zazmluvnená hodnota	Hodnota schválených ŽoNFP v zásobníku	Skutočný stav dosahovania ukazovateľov	Pomer ukazovateľov v zazmluvnených a schválených a celkovej cieľovej hodnoty výstupových ukazovateľov v %
Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany	CO23 ha	20 131	0	0	0	0
Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry	O0010 počet	390	0	0	0	0
Počet novo zaradených monitorovaných lokalít	O0011 počet	700	0	0	0	0
Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu monitorovaných druhov alebo biotopov	O0012 počet	3 000	0	0	0	0
Počet zrealizovaných informačných aktivít	O0178 počet	645	0	0	0	0

V rámci jedinej vyhlásenej výzvy, neboli predložené žiadne žiadosti o NFP. Tento fakt sa odráža aj pri napĺňaní ukazovateľov výstupu programu, ktoré je pre túto IP nulové. Vzhľadom na to, že ex-ante hodnotiaca správa upozorňuje na nedostatočnosť alokácie pre splnenie záväzkov SR v oblasti biodiverzity, hodnotiaca skupina neodporúča znižovanie alokácií pre aktivity priamo súvisiacich s napĺňaním záväzkov, ale naopak sa zamerať na vyhlasovanie výziev, ktoré majú potenciál dobrej absorpcie na základe lepšej komunikácie zainteresovaných skupín.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

1.1.4 Investičná priorita 1.4

Prioritná os	1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita	1.4 – Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Súčasťou štvrtej IP sú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia a sú zamerané najmä na najvýznamnejší identifikovaný problém kvality ovzdušia, a to znečistenie ovzdušia tuhými časticami (PM10, PM2,5), predovšetkým z lokálnych zdrojov.

Pre IP 1.4 boli zadefinované dva špecifické ciele: Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality – 1.4.1., Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou) – 1.4.2.

1.1.4.1 Administrácia výziev

Z pôvodného Indikatívneho harmonogramu výziev vydaného v decembri 2014 verzia 1 vyplýva, že v priebehu roka 2015, resp. až do februára 2016 sa plánovalo vyhlásiť 5 výziev v hodnote 359 844 329 EUR. V roku 2015 boli reálne vyhlásené 4 výzvy v hodnote 223 330 000 EUR. Z pôvodne plánovaných výziev neboli vyhlásené výzvy pre aktivitu B Špecifického cieľa 1.4.1. v hodnote 1 595 745 EUR a pôvodne predpokladaná alokácia pre aktivitu A Špecifického cieľa 1.4.1. bola znížená o 45 331 775 EUR.

V rámci piatich aktivít a troch oblastí intervencie (kód 083, 084, 089 oblasti intervencie – dimenzia 1) IP 1.4 bolo k referenčnému obdobiu 28.02.2017 reálne vyhlásených 5 dopytovo orientovaných výziev v hodnote 312 580 000 EUR. V harmonograme výziev pre rok 2017 sa ráta s vyhlásením ďalších výziev pre danú IP pre Informačné aktivity a výzvu pre aktivitu C špecifického cieľa 1.4.1. vo výške 22 000 000 EUR.

Vyhlásené výzvy boli zamerané na prieskum environmentálnych záťaží (výzva č. 3 – oblasť intervencie 089), na monitorovanie environmentálnych záťaží (výzva č. 4, oblasť intervencie 089), na sanáciu environmentálnych záťaží (výzva č. 5, oblasť intervencie 089), na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (výzva č. 7, oblasť intervencie 083) a na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne (výzva č. 14, oblasť intervencie 083).

Alokácia pre výzvu č. 3, 4 a 5 pokrýva aktivitu A Špecifického cieľa 1.4.2. pre nasledujúce časti zamerania aktivity:

- realizácia prieskumu prioritných environmentálnych záťaží, vrátane vypracovania analýzy rizika znečisteného územia,

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

- zabezpečenie realizácie sanačných prác v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“ a v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci subjektom zúčastňujúcim sa hospodárskej súťaže,
- zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží.

Alokácia pre výzvy č. 7 a č. 14 pokrýva aktivitu A Špecifického cieľa 1.4.1. Výzvou boli pokryté nasledujúce časti aktivity podľa OP KŽP:

- inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológií (napr. tkanivové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.),
- opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Časť aktivity A1 Špecifického cieľa 1.4.1. z OP KŽP – projekty náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách nízko emisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami vrátane modernizácie vykurovacích systémov, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízko emisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov energie nebola doposiaľ pokrytá žiadnou výzvou. S výzvou pre túto časť aktivity sa podľa harmonogramu výziev nepočíta ani v roku 2017.

Žiadna výzva nebola vyhlásená pre aktivity B1 špecifického cieľa 1.4.1. – Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, C1- Špecifického cieľa 1.4.1. – Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia. V roku 2017 budú vyhlásené výzvy pre tieto aktivity v hodnote 23 250 000 EUR.

Aktivitu B2 Špecifického cieľa 1.4.2. – Zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží nezahŕňa žiadna výzva, ani v harmonograme výziev pre rok 2017 nie je uvedená výzva, ktorá by túto aktivitu pokrývala.

1.1.4.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Graf 10 znázorňuje absorpčnú kapacitu výziev, ktorá je najvyššia pri výzve č. 7 pre oblasť intervencie 083 (schválené žiadosti o NFP dosahujú až 80 % alokácie) a tiež pre uzatvorenú výzvu č. 14 pre rovnakú oblasť intervencie 083 (dosahuje hodnotu 76 % z celkovej alokácie pre výzvu). **Napriek faktu, že výzvy č. 3 a č. 4 boli vyhlásené ešte v roku 2015, možno konštatovať, že výška schváleného príspevku pre výzvu č. 3 dosahuje 33 % z celkovej alokácie pre výzvu a pri výzve č. 4 je to 63 %. Pri výzve č. 5 nebola, v rámci 9. hodnotiacich kôl prijatá žiadna žiadosť o NFP (oprávneným žiadateľom sú subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je možné určiť povinnú osobu v súlade s princípom znečisťovateľ platí).** Pri výzve č. 5, zameranej na sanácie environmentálnych záťaží, neustále prebieha komunikácia s Európskou komisiou (Generálnym riaditeľstvom pre hospodársku súťaž – DG COMP) vo veci notifikácie štátnej pomoci v prípade sanácie environmentálnych záťaží, keď

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

povinnosť sanácie prechádza na štát, avšak sanácia sa vykonáva na pozemkoch súkromných subjektov/podnikov, čím dochádza k poskytnutiu štátnej pomoci.

Graf 10



Miera kontraktácie schválených žiadostí o NFP dosiahla pri všetkých doteraz hodnotených výzvach (okrem problematickej výzvy č. 5, pri ktorej nebol predložený žiadny projekt) 100 %, čo znamená, že všetky schválené projekty boli k referenčnému dátumu zazmluvnené. **Rizikovou oblasťou zostáva čerpanie finančných prostriedkov, keďže miera čerpania prostriedkov je 0 % aj napriek faktu, že väčšina výziev bola vyhlásených pred viac ako 12 mesiacmi.**

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je potrebné v rámci finančného pokroku sledovať, sú oblasti intervencií danej PO, ktorých alokácie sú uvedené v OP KŽP.

Graf 11 zobrazuje pomer výšky celkovej alokácie pre danú oblasť intervencie, výšky alokácie pre doteraz vyhlásené výzvy a výšky schváleného príspevku pre jednotlivé oblasti intervencií IP 1.4. Výška schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy č. 7 a 14 indikuje dosiahnutie 50 % alokácie pre oblasť intervencie s kódom 083 – Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia. **Pre oblasť intervencie 084 – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) nebola zatiaľ vyhlásená výzva, ale v roku 2017 je predpoklad vyhlásenia výzvy pre oblasť infoaktivít. Alokácia pre oblasť intervencie 089 – Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy bola doteraz pokrytá schválenými žiadosťami na 6 %, hoci vyhlásené výzvy pokrývajú až 98 % z celkovej alokácie uvedenej v OP KŽP.** Tento stav je spôsobený potrebou notifikácie štátnej pomoci v prípade sanácie environmentálnych záťaží pri výzve č. 5 Európskou komisiou.


Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 11

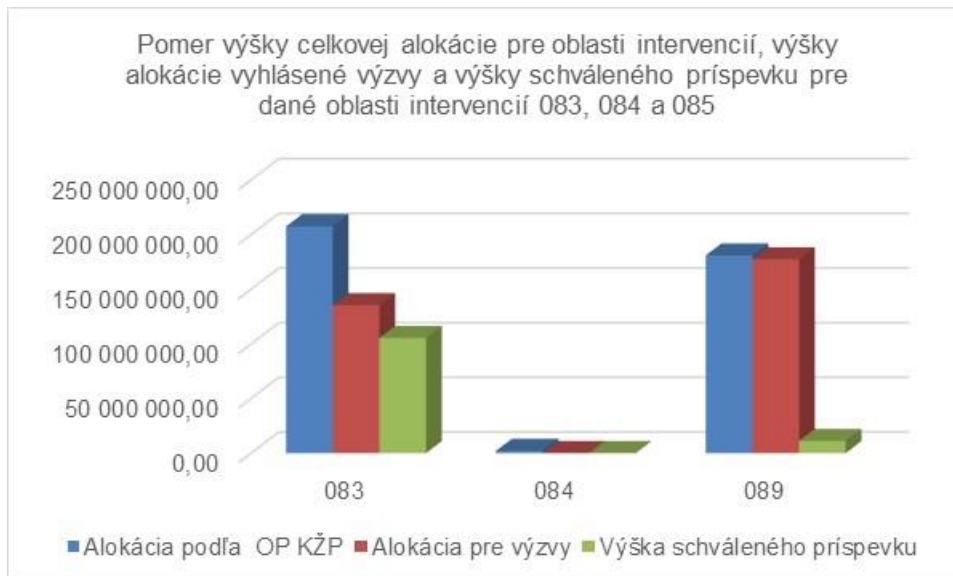

1.1.4.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie naplňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Nastavenie ukazovateľov OP KŽP pre IP 1.4., podobne ako pri všetkých IP PO 1, vychádzalo podľa Záverečnej správy ex – ante hodnotenia zo skúseností v predošlom období a rešpektovalo všetky relevantné usmernenia. Ukazovatele na úrovni výstupov boli nastavené tak, aby zodpovedali jednotlivým typom aktivít.

Stanovenie hodnôt ukazovateľov sa z väčšej časti opiera o analýzy pripravené na základe ukazovateľov zo štatisticky reprezentatívnej vzorky podobného typu projektov zrealizovaných v programovom období 2007 - 2013.

Podobne aj na úrovni výsledkov boli jednotlivé hodnoty ukazovateľov stanovené výpočtom, ktorý vychádzal z údajov získaných počas programového obdobia 2007 – 2013 a ním bol pripočítaný predpokladaný príspevok z iných zdrojov, alebo sú podložené expertným odhadom.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Tabuľka zobrazujúca vecný pokrok IP 1.4:

Celkový povrch rekultivovanej pôdy	Kód ukazovateľa projektu	Cieľová hodnota 2023	Zazmluvnená hodnota	Hodnota schválených ŽoNFP v zásobníku	Skutočný stav dosahovani a ukazovateľov	Pomer ukazovateľov v zazmluvnených a schválených projektoch a celkovej cieľovej hodnoty výstupových ukazovateľov v %	Cieľová hodnota ukazovateľ a v roku 2018 (sledované pri ukazovateľoch výkonnostného rámca)
Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií	O0177, počet	20	22	0	0	110%	x
Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie	O0174, MW	104	0	0	0	0%	x
Počet podporených akreditovaných odborných miest NMSKO	O0015, počet	131	0	0	0	0%	x
Počet aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a reportingových povinností	O0016, počet	3	0	0	0	0%	x
Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží	O0017, ha	36	12	0	0	34%	x
Celkový povrch rekultivovanej pôdy	CO22, ha	125	0	0	0	0%	15
Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží	O0018 ha	446	205	0	195	46%	x
Počet zrealizovaných informačných aktivít	O0178, počet	516	0	0	0	0%	x

Na základe analýzy ukazovateľov výstupu programu, ktoré vychádzajú z ukazovateľov projektu, je zrejmé, že prognóza (plánovaná hodnota ukazovateľa v zazmluvnených projektoch) dosiahnutia najvyššej miery ukazovateľov výstupu programu z celkovej hodnoty v doteraz zazmluvnených projektoch pri špecifickom ciele 1.4.1. (

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP


Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 12) je pri ukazovateli O0177 – Počet podporených zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom zníženia emisií, ktorý predpokladá naplnenie na 110 %. **Ostatné ukazovatele výstupu programu nie sú zatiaľ napĺňané z dôvodu, že k referenčnému dátumu nebola vyhlásená výzva pre aktivitu B – Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (ukazovateľ O0178) a aktivitu C – Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia (ukazovateľ O0015 a O0016).** Výzvy pre tieto aktivity sú plánované na rok 2017 v hodnote 23 250 000 EUR. Výzva na predloženia žiadostí o NFP, ktorých aktivity by viedli k napĺňaniu ukazovateľa O0174 – Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie nebola zaradená medzi plánované výzvy v roku 2017.

Skutočný stav dosiahnutia hodnôt ukazovateľa O0177 je nízky vzhľadom na neskorší začiatok realizácie projektov spôsobený predĺžením kontraktnej fázy a tiež problémami resp. prolongáciami, ktoré vznikli pri procese verejných obstarávaní vykonávaných prijímateľmi.

Graf 12

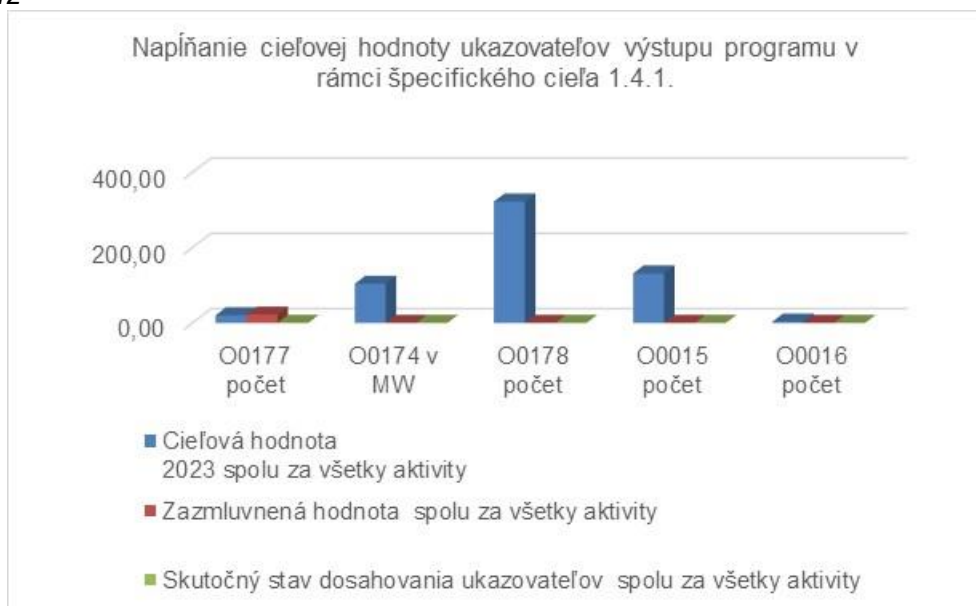

Z Graf 13, ktorý zobrazuje napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu v rámci špecifického cieľa 1.4.2. je zrejmé, že najväčší pokrok v napĺňaní ukazovateľov výstupu programu bol dosiahnutý pri ukazovateli O0018 – Plocha monitorovaných environmentálnych záťaží. Skutočný stav naplnenia tohto ukazovateľa k referenčnému dátumu je cca. 44%.

Pri ukazovateli O0017 – Plocha preskúmaných environmentálnych záťaží je prognóza naplnenia po skončení doteraz zazmluvnených projektov 33 %. Oba ukazovatele sa sledujú pri projektoch v rámci výziev č. 3 a č. 4. a ktoré sa týkajú aktivity A špecifického cieľa 1.4.2. **Ukazovateľ výstupu programu pre špecifický cieľ 1.4.2 O0178 – Počet zrealizovaných informačných aktivít nie je zatiaľ napĺňaný z dôvodu nevyhlásenia príslušnej výzvy.**

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP


Správa - Príloha 1

Máj 2017

Ukazovateľ výstupu programu CO22 – Celkový povrch rekultivovanej pôdy bol zaradený do sledovaných ukazovateľov výkonnostného rámca pre IP 1,4. **Na základe aktuálneho stavu výzvy č. 5 zameranú na sanáciu environmentálnych zátŕaží, ktorá predpokladá zmenu národnej legislatívy a notifikáciu štátnej pomoci zo strany EK je prognóza naplnenia mílnika pri ukazovateli výkonnostného rámca za IP 1.4.6e v roku 2018 nepriaznivá (viď**

Graf 14).

Graf 13

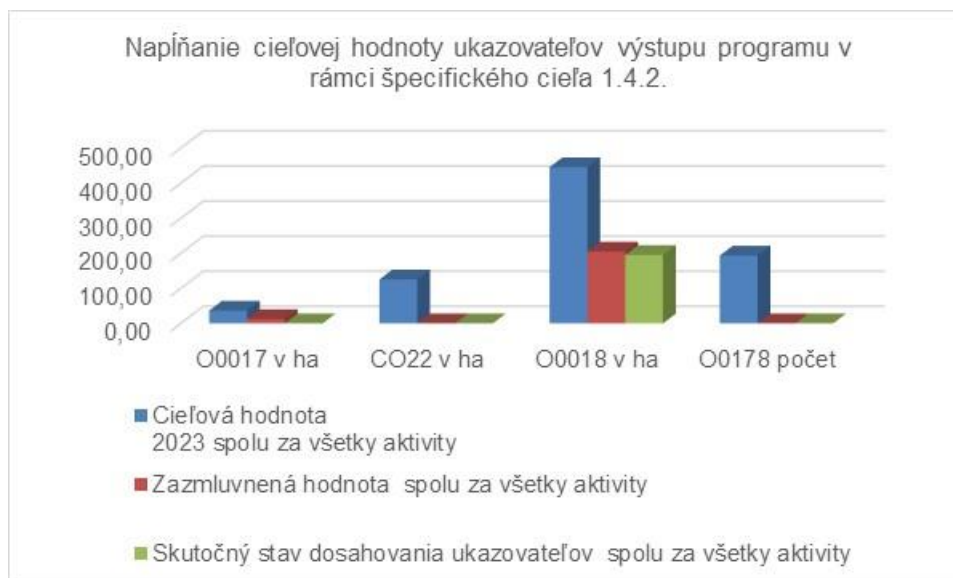


Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 14

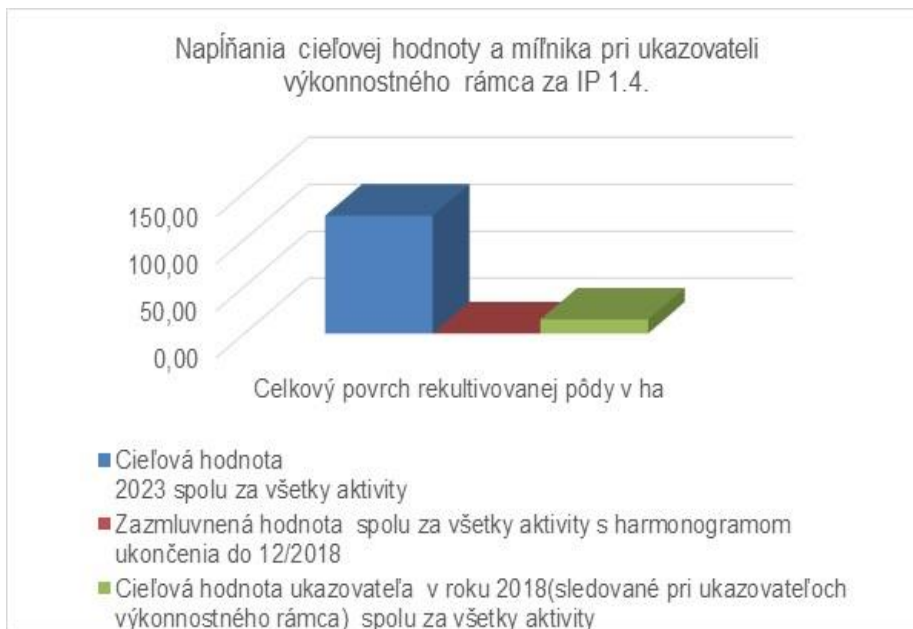

1.2 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 2 (PO2)

1.2.1 Investičná priorita 2.1

Prioritná os	2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita	2.1 – Podpora investícií na prispôbovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

1.2.1.1 *Prioritná os 2 (ďalej len „PO2“) obsahuje 1 investičnú prioritu, zabezpečujúcu príspevok k 2 špecifickým cieľom, ktorej aktivity sú zamerané na oblasť intervencie č. 87 podľa kategorizácie definovanej v OP KŽP (t.j. opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof). Administrácia výziev*

Harmonogram vyhlasovania výziev bol počas rokov 2015 až 2017 viackrát menený. Postupne sa predpokladalo, že v rámci PO2 budú najprv vyhlásené výzvy na aktivity A, B a F. V rokoch 2015 a 2016 nebola zverejnená žiadna výzva v rámci PO2. V poslednej verzii harmonogramu výziev na rok 2017, ktorá bola zverejnená 28.2.2017, sa predpokladá v roku 2017 s vyhlásením 2 výziev, konkrétne na aktivity A a C.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

V rámci PO2 bola k 28.02.2017 vyhlásená 1 dopytovo orientovaná výzva:

— Výzva č. 18 (kód výzvy: OPKŽP-PO2-SC211-2017-18) – vyhlásená dňa 24.2.2017

Vyhlásená výzva bola zameraná na aktivitu B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov v extraviláne sídiel. Celková alokácia na uvedenú výzvu bola stanovená na 50 mil. EUR. Jedná sa o otvorenú výzvu, ktorá bude obsahovať „n“ hodnotiacich kôl. Vo výzve boli predbežne stanovené termíny pre 2 hodnotiace kolá, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 15.5.2017 a v prípade druhého hodnotiaceho kola na 15.8.2017.

V marci 2017 je podľa harmonogramu výziev plánovaná ďalšia výzva na špecifický cieľ 2.1.1. s celkovou alokáciou na 290 000 000 EUR.

Súčasne sa v rámci platného harmonogramu výziev plánuje tiež vyhlásenie výzvy na aktivitu C Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí). Uvedená výzva by mala byť vyhlásená s alokáciou 17 mil. EUR. Pre ostatné aktivity, t.j. D, E, F a A2 zatiaľ výzvy plánované nie sú, čo môže ohroziť ich realizáciu.

1.2.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Celková finančná alokácia na PO2 bola stanovená v sume 419 346 261 EUR. V súčasnosti boli vyhlásené 2 výzvy s celkovou alokáciou 340 000 000 EUR. Nakoľko však k referenčnému dátumu, t.j. k 28.2.2017 nebolo uzatvorené ani jedno hodnotiace kolo, nie je ďalej relevantné posudzovať absorpčnú kapacitu výziev, ani stav kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov v rámci PO2.

V rámci programového obdobia 2014 – 2020 je tiež definovaný inštitút výkonnostnej rezervy, ktorý podmieňuje získanie úplnej alokácie pre danú PO splnením podmienok schválených v OP KŽP. Splnenie podmienok k výkonnostnej rezerve sa sleduje k dátumu 31.12.2018. Z pohľadu čerpania prostriedkov je v tejto oblasti pre PO2 nastavený finančný indikátor čerpania F0002, ktorého cieľová hodnota ku koncu roka má dosiahnuť sumu 118 000 000 EUR (zdroj EÚ + ŠR + vlastné zdroje za celú PO2). Z celkovej alokácie pre PO2, ktorá je stanovená na 493 348 542 EUR, sa teda jedná o čerpanie na úrovni približne 24%. Keďže v súčasnosti nie je v rámci PO2 uzatvorená ani jedna zmluva o NFP, existuje významné riziko, že uvedená podmienka pre získanie výkonnostnej rezervy nebude naplnená a o sumu 25 160 776 EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje hodnotu výkonnostnej rezervy bude alokácia pre PO2 znížená. Uvedená skutočnosť môže mať tiež dopad na splnenie cieľov OP aj pre aktivity C, D, E, F a A2. Toto riziko vyplýva zo skutočnosti, že finančné prostriedky alokované na aktivity A a B môžu byť zazmluvnené a vyčerpané v rámci výziev č. 18 a 21 a pri strate výkonnostnej rezervy nezostanú dostatočné zdroje na výzvy pre niektorú z uvedených aktivít.

1.2.2.1 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Uvedená hodnotiacia otázka je pre prípad PO2 irelevantná, nakoľko k referenčnému dátumu 28.2.2017 neboli zazmluvnené žiadne žiadosti o NFP.

1.3 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 3 (PO3)

1.3.1 Investičná priorita 3.1

Prioritná os	3 – Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita	3.1 – Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Implementáciu PO3 realizuje RO v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom Slovenskou agentúrou životného prostredia (implementácia aktivít v rámci špecifického cieľa 3.1.2.) a so Sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom vnútra SR (implementácia aktivít v rámci špecifických cieľov 3.1.1. a 3.1.3).

PO3 obsahuje 1 investičnú prioritu, zabezpečujúcu príspevok k 3 špecifickým cieľom OP, ktorej aktivity sú zamerané na oblasti intervencie č. 87 a 89 podľa kategorizácie definovanej v OP KŽP (t.j. OI 087 - opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof, OI 089 - Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy).

1.3.1.1 Administrácia výziev

Aj v prípade PO3 bol od roku 2015 viackrát aktualizovaný harmonogram výziev. V súlade s pôvodne platným harmonogramom výziev bola vyhlásená v rámci PO3 len 1 výzva a to na aktivitu B3 Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov. Vyhlásovateľom bol Sprostredkovateľský orgán MV SR, pričom sa jednalo o:

— Výzva č. 2 (kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2) – vyhlásená dňa 19.8.2015.

Alokácia na uvedenú výzvu bola stanovená v hodnote 60 531 000 EUR. V rámci tejto výzvy bolo k referenčnému dátumu uzatvorených 9 hodnotiacich kôl. Celkom bolo predložených 14 žiadostí o NFP v sume 153 118 993,66 EUR, pričom schválené boli 2 v sume 42 643 661,65 EUR. Detailným rozborom bolo identifikované, že sa jednalo o 5 jedinečných žiadostí o NFP. V prvom kole bola (dátum uzatvorenia hodnotiaceho kola bol stanovený ku dňu 30.9.2015) schválená 1 žiadosť o NFP v sume 2 695 683,80 EUR, v druhom kole (dátum uzatvorenia hodnotiaceho kola bol stanovený ku dňu 30.11.2015) bola schválená 1 žiadosť o NFP v sume 39 947 977,85 EUR, ktorá bola v prvom kole neúspešná. Zostávajúce 3 žiadosti boli teda predložené spolu 11 krát, avšak pre ich nedostatočnú kvalitu neboli schválené.

Ak vychádzame z predpokladu, že 3 neschválené žiadosti o NFP budú opätovne predložené a po odstránení nedostatkov schválené v sume rovnajúcej sa poslednej

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

žiadanej výške príspevku (pri poslednom neúspešnom pokuse bola suma spolu za 3 žiadosti o NFP približne 17 mil. EUR), je možné očakávať vyčerpanie celej alokácie na danú výzvu. V prípade jej vyčerpania tak existuje predpoklad, že ciele OP v rámci tejto aktivity budú naplnené.

V aktuálnej verzii harmonogramu výziev sa v roku 2017 ďalej predpokladá vyhlásiť výzvy na aktivity v rámci špecifických cieľov 3.1.1. a 3.1.3..

1.3.1.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

K referenčnému dátumu, t.j. k 28.2.2017 boli zazmluvnené v rámci PO3 dve žiadosti o NFP v celkovej hodnote 42 223 497,99 EUR (len zdroj EÚ) nasledovne:

Názov projektu	Prijímateľ	Dátum uzatvorenia zmluvy o NFP	Zdroj EÚ (v EUR)	Zdroj ŠR (v EUR)	Zdroj ŠR (pro rata) (v EUR)	Zazmluvnená suma (v EUR)
Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	21.3.2016	38 055 230,01	6 715 628,83	1 957 936,53	46 728 795,36
Operatívny záchranný modul	Horská záchranná služba	platnosť: 10.3.2016 účinnosť: 18.3.2016	2 399 103,41	423 371,19	123 433,55	2 945 908,15

V súčasnosti prebieha realizácia uvedených projektov, pričom je možné konštatovať, že k referenčnému dátumu boli ukončené verejné obstarávania, ktoré sú vo väčšine prípadov v schvaľovacom procese na SO, resp. ÚVO. Najmä v prípade projektu „Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér“ je možné konštatovať, že ak budú jednotlivé verejné obstarávania v projekte schválené, dodanie tovarov a služieb a následné čerpanie finančných prostriedkov je možné očakávať už v roku 2017.

Z pohľadu čerpania prostriedkov je v prípade stanovenia podmienok dosiahnutia výkonnostnej rezervy pre PO3 nastavený finančný indikátor čerpania F0002, ktorého cieľová hodnota ku koncu roka má dosiahnuť sumu 74 603 549 EUR (za celú PO3). V prípade, ak bude projekt Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér zrealizovaný v plánovanom termíne na 100%, je možné k dosiahnutiu uvedeného indikátora počítať s celou zazmluvnenou sumou. Okrem toho je možné v danom čase predpokladať aj čiastočné čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektu Operatívny záchranný modul. Avšak riziko nenaplnenia indikátora F0002, a teda prepadnutie finančných prostriedkov viazaných na výkonnostnú rezervu v celkovej sume 17 005 153 EUR (EÚ zdroj), je vzhľadom na absenciu iných projektov zazmluvnených a realizovaných v rámci PO3 vysoké. V prípade plného zazmluvnenia finančných prostriedkov alokovaných na plánované výzvy je taktiež zvýšené riziko, že nezostane dostatočný objem finančných prostriedkov na vyhlásenie výzvy v rámci aktivity A2.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

1.3.1.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

V rámci zazmluvnených projektov môžeme hovoriť o 2 typov projektových ukazovateľov výstupu a to:

- Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov;
- Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy.

Štruktúru zazmluvnených ukazovateľov podľa zazmluvnených projektov uvádzame v tabuľke nižšie:

Názov projektu	Ukončenie realizácie aktivít	Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov (P0529)	Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy (P0557)
Operatívny záchranný modul	1/2019	1	4
Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér	12/2018	1	5
Spolu		2	9

Keďže k referenčnému dátumu boli zatiaľ zazmluvnené len žiadosti o poskytnutie NFP pre aktivitu B3 Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov a teda špecifický cieľ 3.1.3., je možné v danom čase hodnotiť len schopnosť dosiahnutia cieľov OP pre túto aktivitu, resp. tento špecifický cieľ. Na programovej úrovni sa pre špecifický cieľ 3.1.3. sledujú 2 ukazovatele a to:

- Počet subjektov so zlepšeným vybavením intervenčnými kapacitami (O0026);
- Počet vytvorených špecializovaných záchranných modulov (O0027).

Z vyššie uvedených projektových ukazovateľov sa však len ukazovateľ P0529 agreguje do niektorého z programových ukazovateľov, konkrétne do ukazovateľa O0027. Jeho plánovaná cieľová hodnota k 31.12.2023 je 4. Z uvedeného vyplýva, že realizáciou týchto 2 projektov a ich úspešným dokončením bude ukazovateľ O0027 naplnený na 50%.

1.4 Zhodnotenie stavu OP KŽP na úrovni investičných priorít prioritnej osi 4 (PO4)

Prostredníctvom prioritnej osi 4 implementuje Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia opatrenia zamerané na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo využívaním obnoviteľných zdrojov energie a zlepšovaním energetickej efektívnosti. Celkom je na tento účel vyčlenených 938 886 480 EUR z EFRR.

Prioritná os 4 sa vzťahuje na dve kategórie regiónu, a to menej rozvinuté regióny SR a rozvinutejší región SR.

Prioritná os 4 je rozdelená na 5 investičných priorít:

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

- 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov (OZE);
- 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch (PODNIKY);
- 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania (BUDOVY);
- 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy (STRATÉGIE);
- 4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple (KVET).

1.4.1 Investičná priorita 4.1

Prioritná os	4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4.1 – Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

V rámci investičnej priority 4.1 je OP KŽP zameraný na podporu perspektívnych a inovatívnych technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, čím sa zvýši výroba tepla a elektriny z OZE. Zároveň bude podporovaná aj inštalácia malých zariadení OZE v domácnostiach (nie len v menej rozvinutých regiónoch, ale aj v Bratislavskom samosprávnom kraji). Špecifické ciele tejto investičnej priority sa týkajú zvýšenia podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji.

1.4.1.1 Administrácia výziev

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 (dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná jedna výzva v hodnote 25 000 000 EUR.

V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Dňa 25.09.2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam v rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a Špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom vyzvania OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie bola 37 320 251,60 EUR z EFRR.

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1. ŽoNFP predložená v rámci investičnej priority č. 4.1 bola schválená a projekt „Podpora výroby a

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov“ bol zazmluvnený v sume 5 000 000 EUR za EÚ zdroj (EFRR).

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Graf 15



Graf 16



Dôvody nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.1.1, aktivita A:

V dôsledku toho, že v roku 2016 nebol prijatý, resp. implementovaný dokument "Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu" nebolo možné vyhlásiť výzvu na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.1.1, aktivita B:

Podpora zariadení na výrobu/využívanie bioplynu a biometánu je podmienená splnením kritérií udržateľného využívania poľnohospodárskej biomasy, ktoré musia byť v súlade s odporúčaniami EK, avšak doteraz neboli v SR prijaté.

V OP KŽP je tiež uvedené, že pri výstavbe zariadení budú zvýhodnené projekty zamerané na podporu zariadení KVET a tiež v súvislosti s využívaním bioplynu a skládkového plynu bude podporená realizácia projektov výroby tepla v zariadeniach KVET. V roku 2016 bol však tzv. "stav obmedzeného pripájania" rozvoja KVET, čo mohlo byť jedným z dôvodov, pre ktoré SIEA nevyhlásila výzvu na podporu zariadení OZE a čakala na doriešenie danej situácie za účelom vyhlásenia komplexnej výzvy zameranej na podporu všetkých zariadení obsiahnutých v rámci predmetnej aktivity, aj keď bolo možné vyhlásiť výzvu pre tie zariadenia, ktoré nie sú obmedzené "stop-stavom" a kritériami udržateľného využívania biomasy (napr. tepelné čerpadlá alebo geotermálne projekty, ktoré si vyžadujú dlhý čas realizácie, a i.).

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 (dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 4 dopytovo orientované výzvy (aktivity A a B) v hodnote 56 656 500 EUR.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 17



1.4.1.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

S výnimkou prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP prispieva k čerpaniu finančných prostriedkov v rámci investičnej priority 4.1 len národný projekt „Zelená domácnostiam“.

Výška finančných prostriedkov za zdroj EFRR zo žiadostí o platbu predložených v rámci tohto národného projektu a zaradených do súhrnných žiadostí o platbu schválených certifikačným orgánom je k 28.02.2017 5 676 010,26 EUR, t.j. 15,21 % oprávnených výdavkov projektu za zdroj EFRR (37 320 252,00 EUR).

Objem vyčerpaných finančných prostriedkov vrátane prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP predstavuje 6 926 010,27 EUR.

Alokácia na investičnú prioritu 4.1 je 169 000 000,00 EUR. Výška zazmluvnených finančných prostriedkov (vrátane tranží v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP) predstavuje 42 320 252,00 EUR. Výška finančných prostriedkov plánovaných vo výzvach na predloženie žiadostí o NFP na rok 2017 je 56 656 500,00 EUR.

Nízka miera čerpania finančných prostriedkov je spôsobená omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní výziev.

1.4.1.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie naplňovania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Ukazovateľ č. CO30 – Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov je zaradený medzi ukazovatele výkonnostného rámca prioritnej osi 4. Na základe analýzy RO a predpokladaného naplnenia hodnôt ukazovateľov vyplývajúcich zo zazmluvnených hodnôt k 28.02.2017 a hodnôt s predpokladom ukončenia do 31.12.2018 je možné

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

konštatovať, že tento ukazovateľ nepredstavuje riziko straty výkonnostnej rezervy vyplývajúce z nenaplnenia plánovaných hodnôt. Miera predpokladaného naplnenia tohto ukazovateľa na základe zazmluvnených hodnôt k 28.02.2017 a hodnôt s predpokladom ukončenia do 31.12.2018 je 13,38% pre MRR, resp. 134% pre VRR.

Výsledky predpokladaného napĺňania ukazovateľov pre investičnú prioritu IP 4.1. priamo korelujú s finančným pokrokom. K napĺňaniu relevantných ukazovateľov na základe skutočnej realizácie projektov prispieva len realizácia národného projektu „Zelená domácnostiam“. Potenciálne napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu podľa analýzy RO na základe údajov o zazmluvnených ukazovateľoch k referenčnému dátumu (28.02.2017) je veľmi nízke. Hodnoty naplnenia ukazovateľov pre špecifické ciele týkajúce sa menej rozvinutých regiónov SR sa pohybujú v rozmedzí od 4,35 % po 41,93 %. Vplyvom úspešnej realizácie NP „Zelená domácnostiam“ sa potenciálne napĺňanie ukazovateľov výstupu programu pre špecifický cieľ určený pre Bratislavský samosprávny kraj pohybuje v rozmedzí 20,69 % - 266,67 %.

1.4.2 Investičná priorita 4.2

Prioritná os	4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4.2 – Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

V rámci investičnej priority IP 4.2. je OP KŽP zameraný na zavedenie programu na podporu energetických auditov pre malé a stredné podniky, pre objektívne stanovenie potenciálu úspor energie, na základe ktorého budú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE. Podporou realizácie takýchto opatrení sa zníži energetická náročnosť výroby v podnikoch.

1.4.2.1 Administrácia výziev

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 (dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná jedna výzva v hodnote 12 000 000 EUR.

V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 (dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) boli na rok 2016 naplánované 2 výzvy v hodnote 90 000 000 EUR.

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1. Pre ŠC 4.2.1 nebola predložená žiadna ŽoNFP.

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1


Máj 2017

Implementáciu PO4 nepriaznivo ovplyvňuje aj pomerne dlhý proces schvaľovania schém štátnej pomoci, čo sa v minulosti už prejavilo na oneskorenom vyhlásení výzvy a v súčasnosti ovplyvňuje vyhlásenie výzvy v rámci špecifického cieľa 4.2.1 so zameraním na energetické audity v MSP (Aktivita A) a implementáciu opatrení energetickej efektívnosti v podnikoch (Aktivita B).

Graf 18



Graf 19

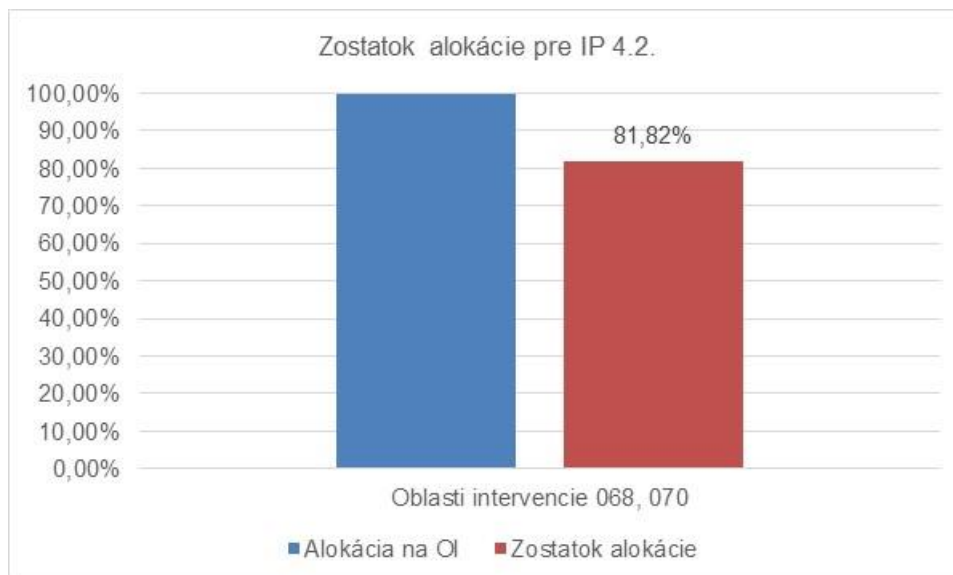

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 (dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 2 výzvy v hodnote 90 000 000 EUR.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 20



Z Graf 20 vyplýva, že na rok 2017 sú naplánované výzvy s alokáciou pokrývajúcou celý zostatok alokácie na príslušné oblasti intervencií, resp. zostatok alokácie na túto investičnú prioritu.

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1.

1.4.2.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Miera čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto investičnej priority predstavuje 0 % (s výnimkou prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP). Tento stav je spôsobený omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní výziev.

Objem vyčerpaných finančných prostriedkov vrátane prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP predstavuje 5 000 000 EUR.

Alokácia na investičnú prioritu IP 4.2 je 110 000 000,00 EUR. Výška zazmluvnených finančných prostriedkov (tranže v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP) predstavuje 20 000 000 EUR.

1.4.2.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Odhadovať napĺňanie ukazovateľov výstupu programu je k referenčnému dátumu možné len na základe prevodu tranží v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Potenciálne napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu podľa analýzy RO na základe údajov o zazmluvnených ukazovateľoch k referenčnému dátumu (28.02.2017) je veľmi nízke. Hodnoty naplnenia ukazovateľov sa pohybujú v rozmedzí od 0,00 % po 22,22 %.

Detailnú analýzu a prognózu naplnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu programu bude možné uskutočniť na základe úspešnosti výziev naplánovaných na rok 2017.

1.4.3 Investičná priorita 4.3

Prioritná os	4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

V rámci investičnej priority IP 4.3. je OP KŽP zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov t. j. budov štátnej správy a miestnej samosprávy. Prioritou budú najmä komplexné projekty, t.j. projekty v ktorých sa budú kombinovať opatrenia na úsporu energie v budovách, ktoré budú navrhované na zníženie potreby energie na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.

1.4.3.1 Administrácia výziev

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 (dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná jedna výzva v hodnote 150 000 000 EUR.

Dňa 07.12.2015 bola zverejnená 6. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu bola 160 000 000 EUR.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 (dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) bola na rok 2016 naplánovaná 1 výzva v hodnote 120 000 000 EUR.

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzvala dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1. Predložená ŽoNFP bola schválená a projekt „Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov“ bol zazmluvnený v sume 12 125 939,35 EUR za EÚ zdroj (EFRR).

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017


Graf 21



V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Zavretie 1. výzvy k špecifickému cieľu 4.3.1 nastalo k termínu 26.10.2016, čo zapríčinilo následne posun vyhlásenia 2. výzvy v rámci špecifického cieľa 4.3.1. Pri príprave 2. výzvy bolo potrebné zaktualizovať všetky dokumenty výzvy a upraviť ich na základe skúseností z predchádzajúcej výzvy.

Graf 22

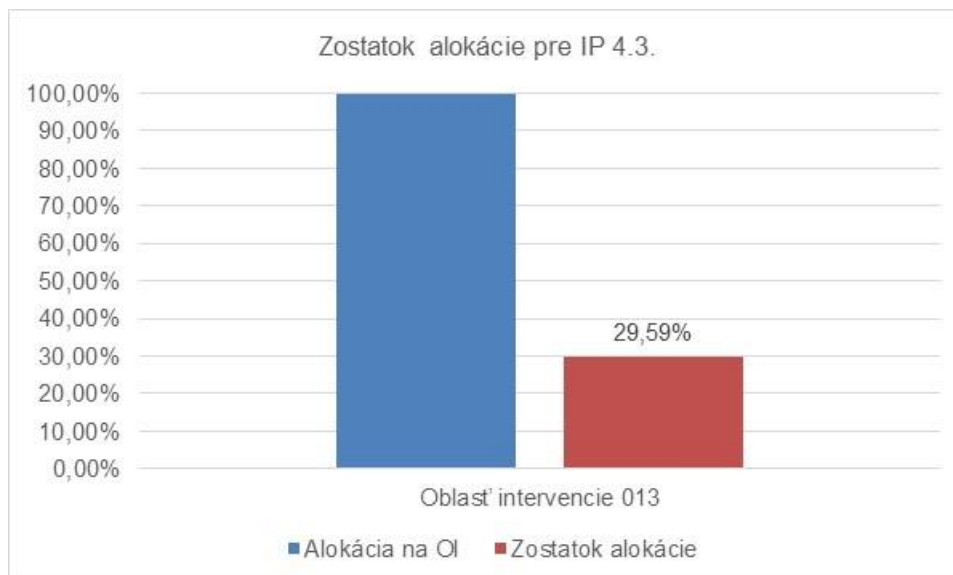

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO, boli z roku 2016 presunuté do roku 2017.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

(dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) je na rok 2017 naplánovaná 1 výzva v hodnote 110 000 000 EUR.

Graf 23



Graf 23 ukazuje, že na rok 2017 sú naplánované výzvy s alokáciou pokrývajúcou takmer 90 % zostatku alokácie pre danú investičnú prioritu.

SIEA ako SO pre OP KŽP vyzval dňa 22.01.2016 žiadateľa SZRB Asset Management, a. s. na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (vyzvanie pre finančné nástroje OP KŽP) v rámci špecifických cieľov 4.1.1, 4.2.1 a 4.3.1.

1.4.3.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

S výnimkou prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP prispievajú k čerpaniu finančných prostriedkov v rámci investičnej priority 4.3 projekty v realizácii zazmluvnené v rámci žiadostí o poskytnutie NFP predložených na základe výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2015-6 vyhlásenej dňa 07.12.2015, nakoľko výzva č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bola vyhlásená len dňa 27.02.2017 a k referenčnému dátumu 28.02.2017 nebola predložená žiadna ŽoNFP. V rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 bolo k 28.02.2017 v rámci 6 hodnotiacich kôl predložených 462 ŽoNFP v celkovej sume 197 363 782,00 EUR. Schválených bolo 298 ŽoNFP v sume 125 076 151,00 EUR a zazmluvnených bolo 121 ŽoNFP v sume 44 764 168,00 EUR.

Výška finančných prostriedkov za zdroj EFRR zo žiadostí o platbu predložených v rámci tejto prioritnej osi a zaradených do súhrnných žiadostí o platbu schválených certifikačným orgánom je k 28.02.2017 1 131 587,64 EUR.

Objem vyčerpaných finančných prostriedkov vrátane prevodu tranží prijímateľovi SZRB Asset Management, a.s. v rámci využívania finančných nástrojov OP KŽP predstavuje 4 163 072,48 EUR.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Alokácia na investičnú prioritu 4.3 je 414 886 480 EUR. Do februára 2017 boli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP v objeme 292 125 939 EUR. Výška zazmluvnených finančných prostriedkov (vrátane tranží v rámci využitia finančných nástrojov OP KŽP) predstavuje 56 890 107 EUR.

1.4.3.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Ukazovatele č. CO30 – Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov a č. O0183 – Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek sú zaradené medzi ukazovatele výkonnostného rámca prioritnej osi 4. Ich napĺňanie je vyhodnotené v samostatnej časti tejsprávy.

Výsledky predpokladaného napĺňania ukazovateľov pre investičnú prioritu 3 priamo korelujú s finančným pokrokom. Potenciálne napĺňanie cieľovej hodnoty ukazovateľov výstupu programu podľa analýzy RO na základe údajov o zazmluvnených ukazovateľoch k referenčnému dátumu (28.02.2017) je však nízke. Hodnoty naplnenia ukazovateľov sa pohybujú v rozmedzí od 9,32 % po 17,64 % s výnimkou ukazovateľa č. CO34 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, kde je na základe zazmluvnených hodnôt ukazovateľov potenciál naplnenia na úrovni 133,25 %. Ani pri predpoklade, že berieme do úvahy hodnoty zo zazmluvnených projektov, projektov zo zásobníka, schválených ŽoNFP a dokonca doručených ŽoNFP, tieto hodnoty nie sú uspokojivé a pohybujú v rozmedzí od 27,63 % po 60,73 %. Opäť je výnimkou ukazovateľ č. CO34, kde je potenciál naplnenia na úrovni 144,92 %.

1.4.4 Investičná priorita 4.4

Prioritná os	4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4.4 – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

V rámci investičnej priority IP 4.4 je OP KŽP zameraný na podporu obcí a iných verejných subjektov, aby prijímali nízkouhlíkové stratégie s jasnými cieľmi a s dôrazom na ochranu životného prostredia, čo je základným predpokladom systematického znižovania emisií skleníkových plynov so zohľadnením regionálnych a lokálnych podmienok. Poradenstvo, zvyšovanie informovanosti a monitoring nízkouhlíkových opatrení pre všetky typy území, bude predmetom národných projektov SIEA.

1.4.4.1 Administrácia výziev

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 (dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) bola na toto obdobie plánovaná jedna výzva v hodnote 3 000 000 EUR.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 (dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) boli na rok 2016 naplánované 3 výzvy v hodnote 25 000 000 EUR.

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Dôvody nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016

Dôvodom nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016 bola prioritizácia špecifických cieľov 4.3.1 a 4.5.1, v rámci ktorých je výrazne vyššia alokácia finančných prostriedkov a teda vyšší predpoklad k významnému príspevku k naplneniu výkonnostného rámca pre danú prioritnú os.

Graf 24




Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 25

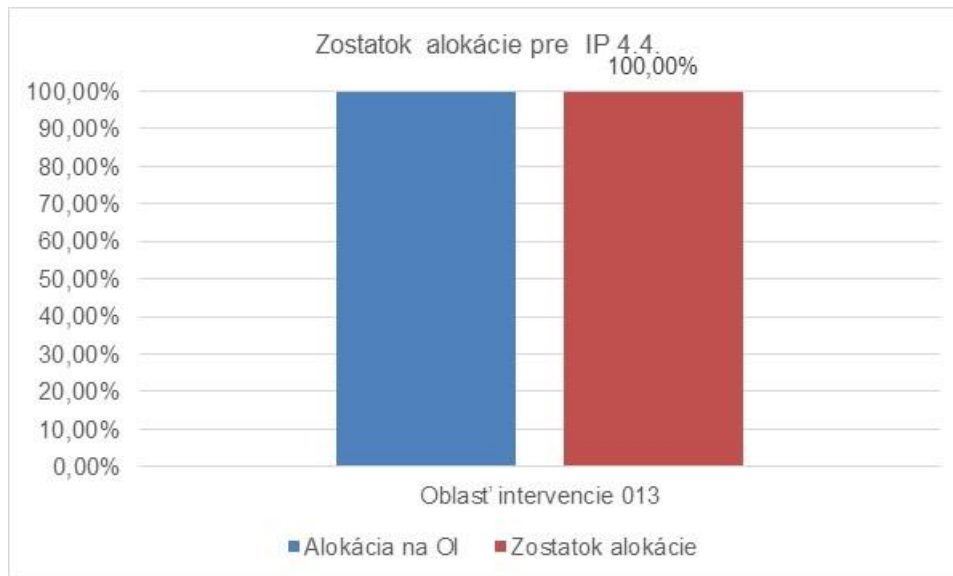

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 (dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 3 výzvy v hodnote 25 000 000 EUR.

Graf 26



Zvyšné aktivity (D, E a F) IP 4.4. týkajúce sa zvyšovania informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení, zavádzania systému pravidelného poradenstva a monitorovania energetickej efektívnosti budú pokryté v rámci národných projektov zabezpečovaných Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Ide o nasledujúce plánované národné projekty:

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

- NP Žiť energiou (ŠC 4.4.1 – aktivita D);
- NP Odborne o energii (ŠC 4.4.1 – aktivita E);
- NP Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti (ŠC 4.4.1 – aktivita F).

Dôvodom nevyhlásenia žiadneho vyzvania v priebehu roku 2016 bola najmä časová náročnosť prípravy návrhov národných projektov z dôvodu ich špecifického charakteru, ktorých schválenie je podmienkou pre vyhlásenie vyzvania.

Momentálne sú vo fáze finalizácie národné projekty:

- Žiť energiou, kde je predpokladaný termín vyzvania a následného predloženia NP v priebehu mája, resp. júna 2017 a
- Rozšírenie monitorovania energetickej efektívnosti, kde je predpokladaný termín vyzvania a následného predloženia NP v priebehu júla, resp. augusta 2017.

NP Odborne o energii je v procese prípravy, predpoklad ukončenia prípravy a teda vyhlásenia vyzvania je koniec roku 2017.

1.4.4.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Miera zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto investičnej priority predstavuje 0 %. Tento stav je spôsobený omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní výziev.

1.4.4.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Žiadny so spoločných ukazovateľov výstupu a špecifických ukazovateľov výstupu na úrovni programu v rámci investičnej priority IP 4. 4 nebol zaradený medzi ukazovatele výkonnostného rámca prioritnej osi 4.

Ukazovatele výstupu programu nie sú zatiaľ napĺňané z dôvodu, že k referenčnému dátumu nebola vyhlásená žiadna výzva.

1.4.5 Investičná priorita 4.5

Prioritná os	4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita	4.5 – Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

V rámci investičnej priority 4. 5 je OP KŽP zameraný na podporu rozvoja efektívnych systémov centralizovaného zásobovania teplom, z dôvodu udržania a zvýšenia podielu dodaného tepla vyrobeného vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Podporované budú najmä opatrenia zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

1.4.5.1 Administrácia výziev

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016) schváleného dňa 22.12.2014 (dátum poslednej aktualizácie 29.09.2015 – verzia 3) boli na toto obdobie plánované dve výzvy v hodnote 185 000 000 EUR.

V roku 2015 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2016) schváleného dňa 31.12.2015 (dátum poslednej aktualizácie 27.12.2016 – verzia 5) boli na rok 2016 naplánované 2 výzvy v hodnote 175 000 000 EUR.

V roku 2016 nebola vyhlásená žiadna dopytovo orientovaná výzva.

Graf 27




Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Graf 28

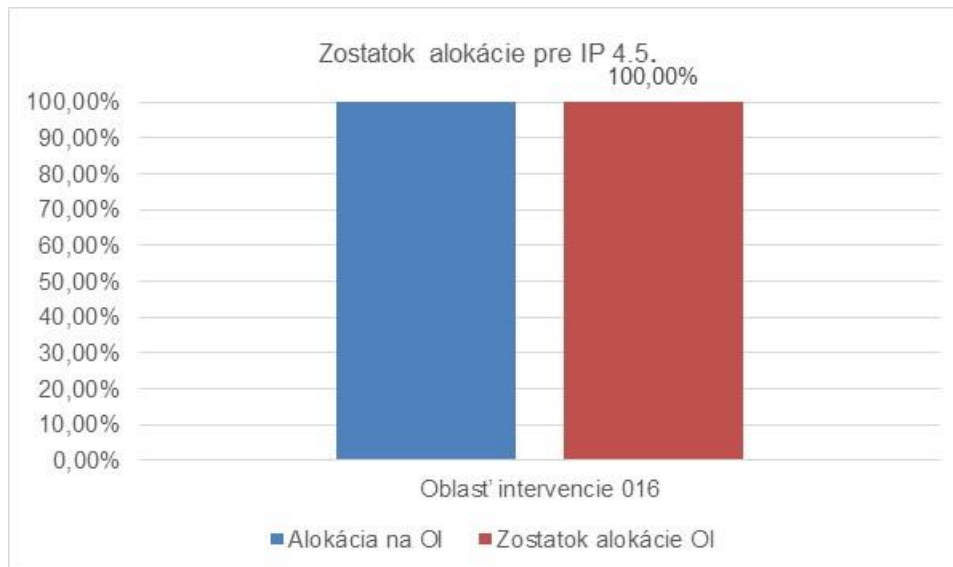

Dôvody nevyhlásenia plánovaných výziev v roku 2016

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.5.1 aktivita A:

V roku 2016 bol tzv. "stav obmedzeného pripájania" na pripájanie nových zdrojov KVET, čím by nebolo možné dosiahnuť plnenie ukazovateľa "zvýšenie inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou založenou na dopyte po využiteľnom teple". Z tohto dôvodu SIEA nevyhlásila výzvu len na modernizáciu a rekonštrukciu zariadení KVET, ale očakávala doriešenie tejto situácie, aby bolo možné vyhlásiť výzvu aj na výstavbu zariadení KVET.

— Výzva v rámci špecifického cieľa 4.5.1 aktivita B:

- Pomerne dlhý schvaľovací proces Schémy štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla zo strany PMÚ – schválenie schémy štátnej pomoci v novembri 2016.
- Zmeny v legislatíve v rámci regulácie cien v tepelnej energetike a vplyv týchto zmien na podmienky výzvy.
- Pomerne zložité nastavenie podmienok výzvy vychádzajúce zo špecifik danej problematiky.

Podľa indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2017) schváleného dňa 31.10.2016 (dátum poslednej aktualizácie 28.02.2017 – verzia 2) sú na rok 2017 naplánované 2 výzvy v hodnote 155 000 000 EUR.

Ministerstvo životného prostredia SR

Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP

Správa - Príloha 1

Máj 2017

Výzvy, ktoré administrovala SIEA ako SO boli z roku 2016 presunuté do roku 2017.

Graf 29



Graf 29 ukazuje, že na rok 2017 sú naplánované výzvy s alokáciou pokrývajúcou zvyšnú alokáciu oblasti intervencie 16 (Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie) na takmer 84 %.

1.4.5.2 Finančný pokrok – schvaľovací proces, kontrahovanie a čerpanie finančných prostriedkov

Miera zazmluvnenia a čerpania finančných prostriedkov v rámci tejto investičnej priority predstavuje 0 %. Tento stav je spôsobený omeškaním (takmer ročným) vo vyhlasovaní výziev.

1.4.5.3 Zhodnotenie vecného pokroku – hodnotenie napĺňania ukazovateľov výstupu programu a ich korelácie s finančným pokrokom

Žiadny so spoločných ukazovateľov výstupu a špecifických ukazovateľov výstupu na úrovni programu v rámci investičnej priority 4.5. nebol zaradený medzi ukazovatele výkonnostného rámca prioritnej osi 4.

Ukazovatele výstupu programu nie sú zatiaľ napĺňané z dôvodu, že k referenčnému dátumu nebola vyhlásená žiadna výzva.
